



FASE 1

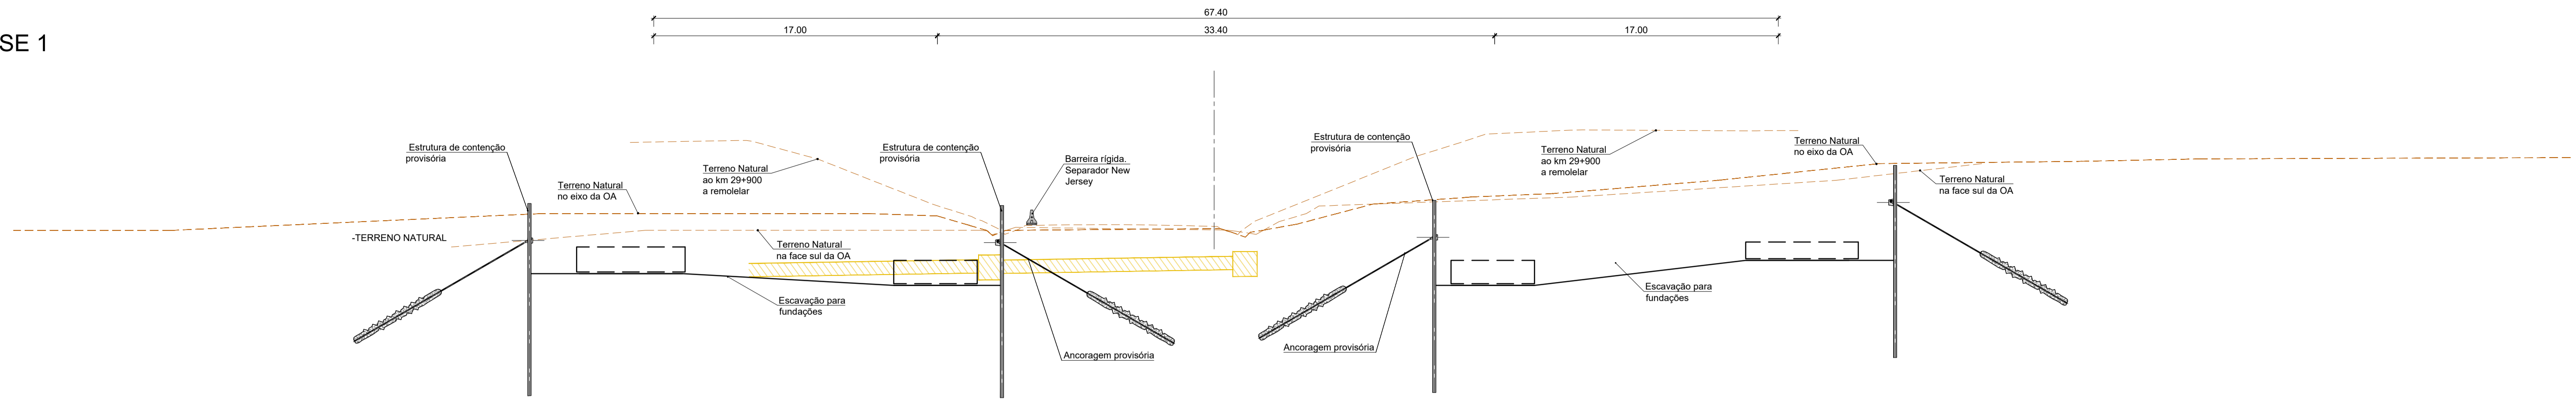

FASEAMENTO DOS TRABALHOS

- Desmatização do terreno e limpeza do local dos trabalhos.
- Instalação de barreiras de segurança e sinalização provisória, com supressão da bermagem oeste do IP8.
- Execução da contenção provisória conforme apresentado a título indicativo na planta do faseamento construtivo. Os perfis verticais deverão estar solidarizados através de vigas de distribuição horizontais, devidamente ancoradas. Entre os perfis verticais deverão ser colocados barretes de madeira ou outra solução que garanta a segurança aos impulsos.
- Escavação para as fundações.

**NOTA:**  
- O empreiteiro terá de apresentar o Projeto de Escavação e de Contenções Provisórias, que terá de ser aprovado pela fiscalização, antes de se iniciarem os trabalhos.

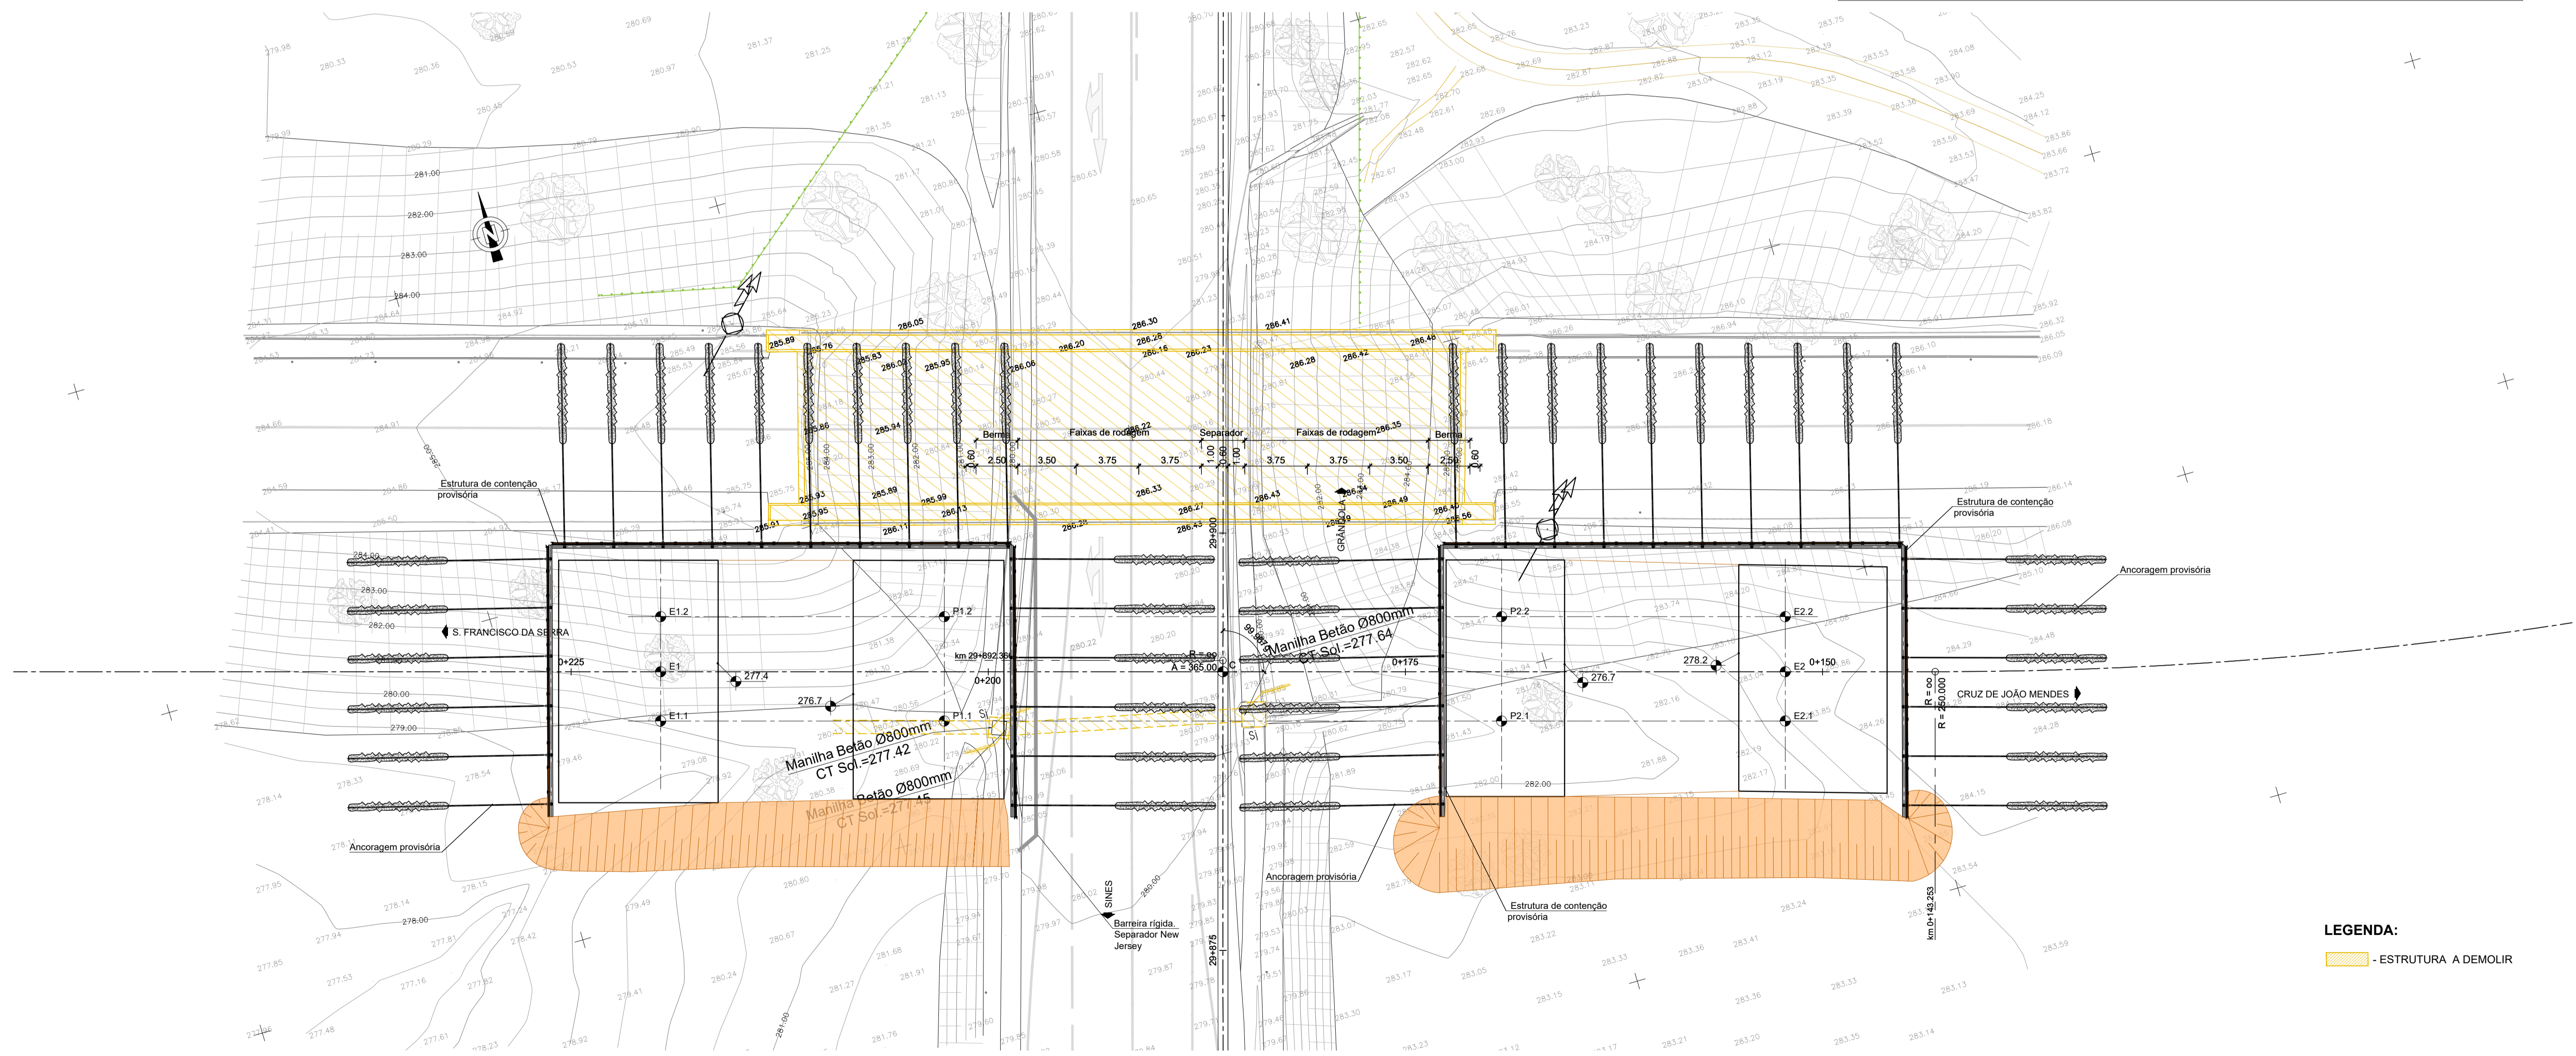

**LEGENDA:**  
- ESTRUTURA A DEMOLIR
