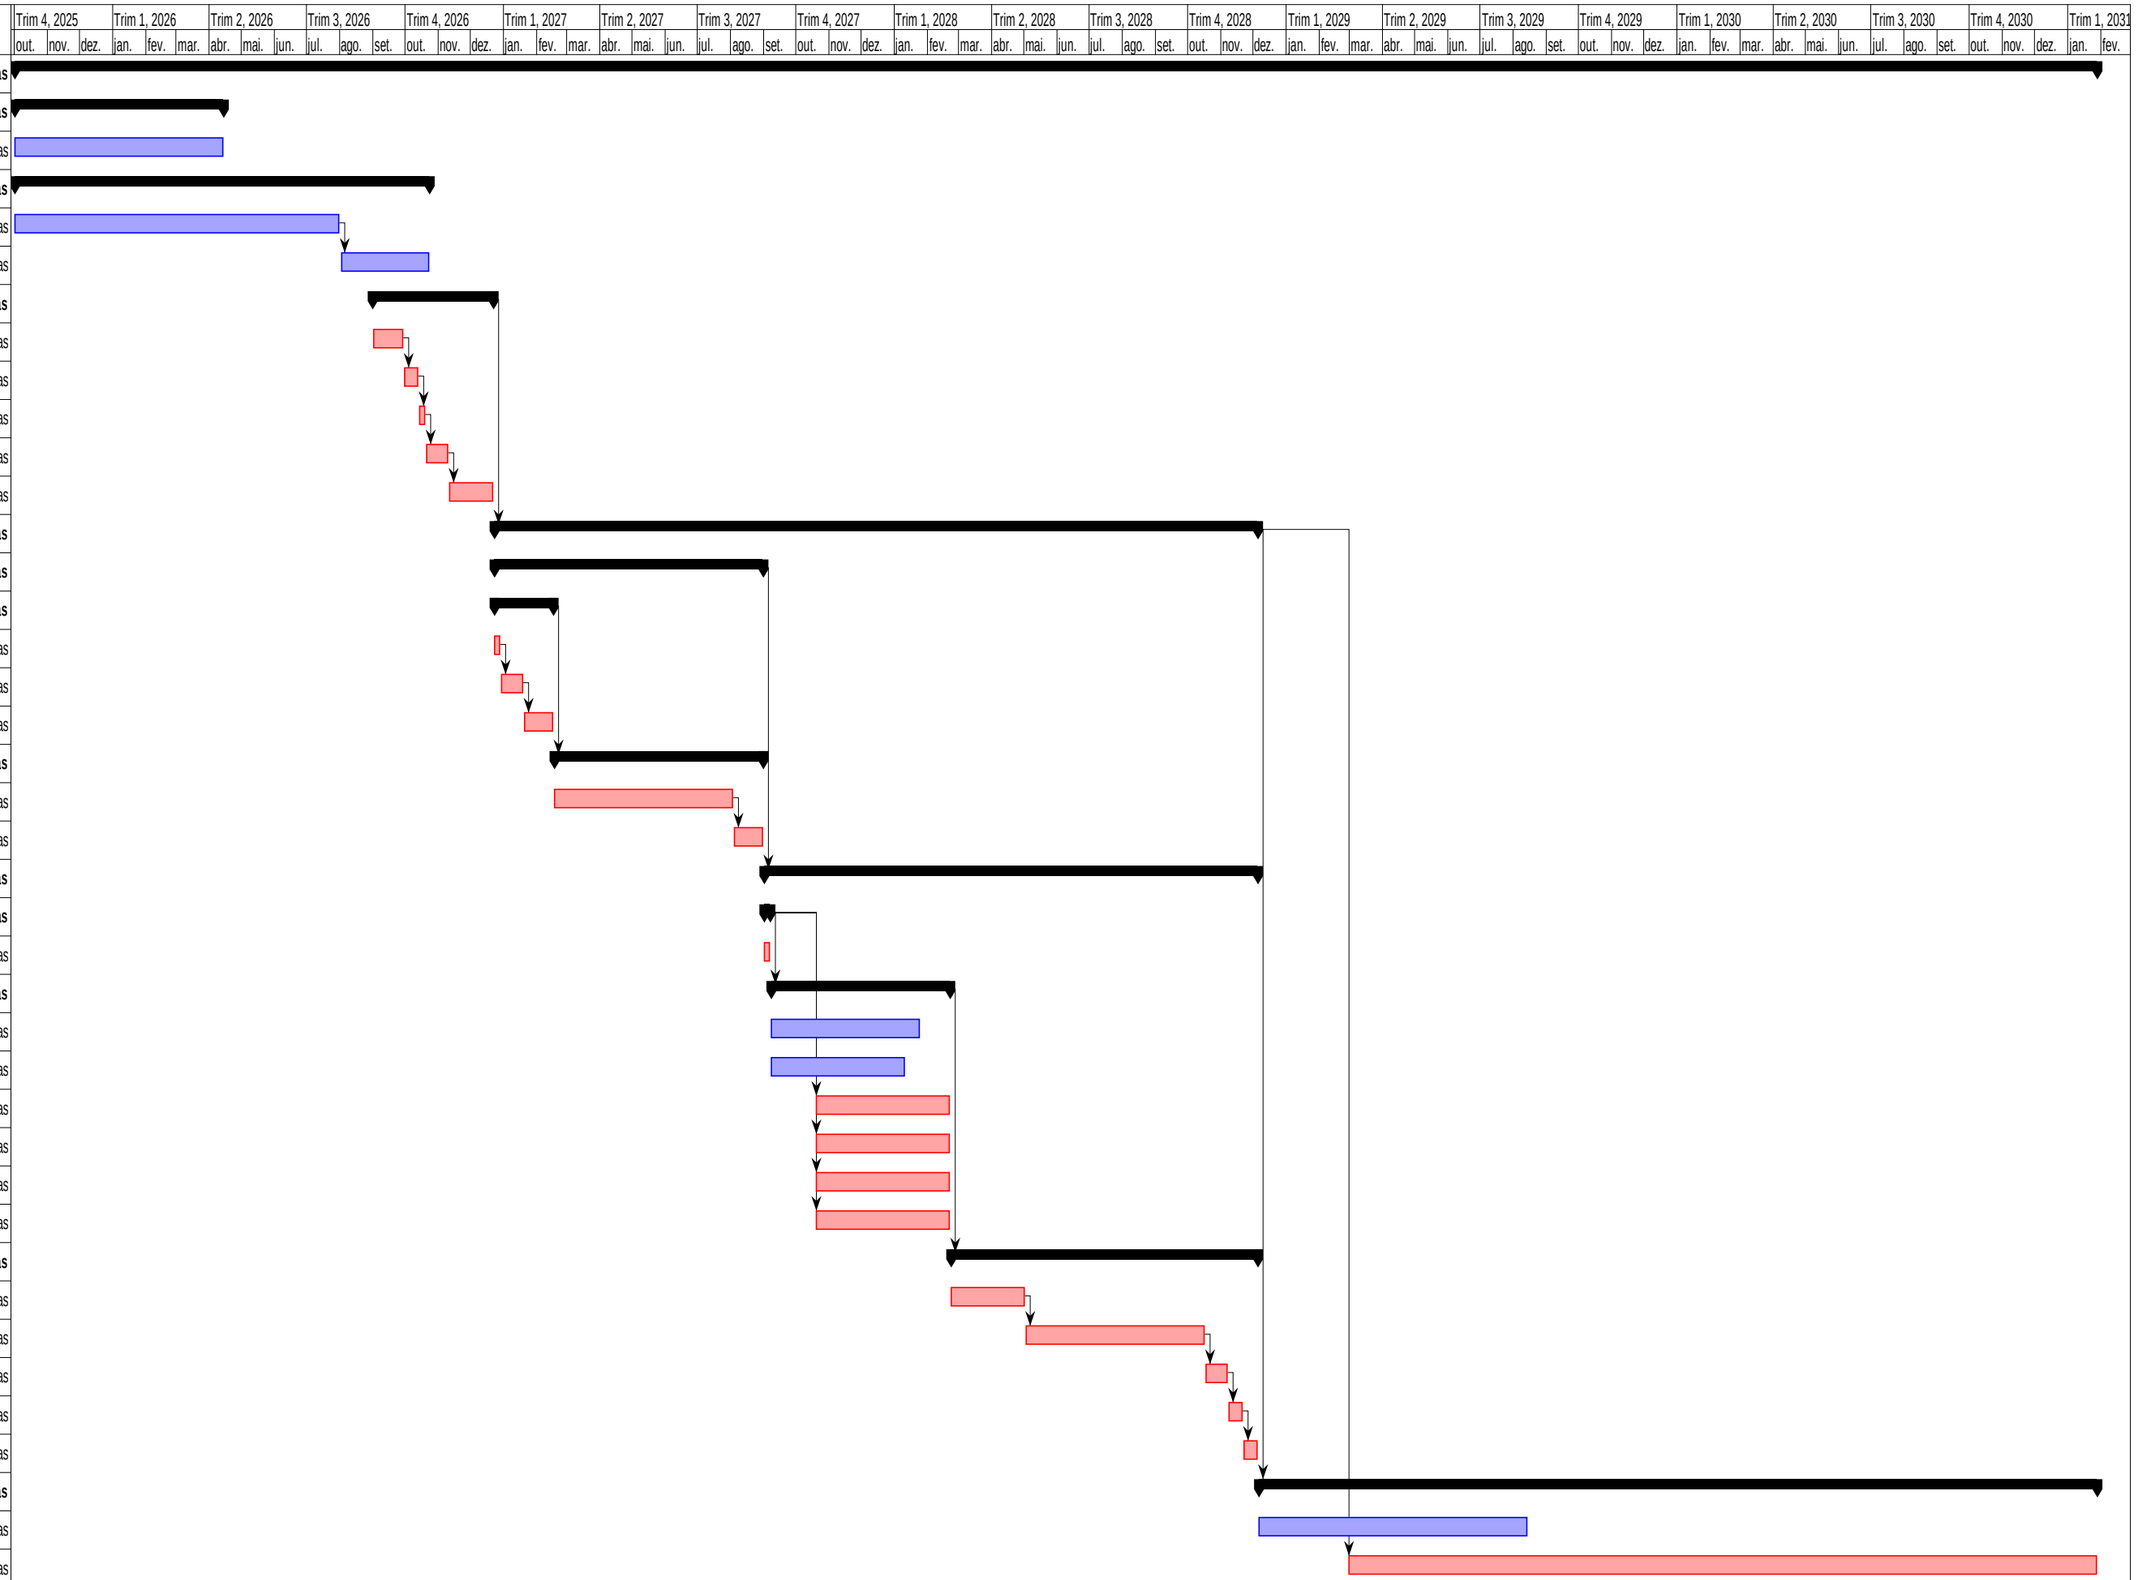	Nome	Duração
1	**Execução da Zona Industrial de Regadas**	**1 390 dias**
2	**Modelação de Terreno - UOPG 28**	**140 dias**
3	Trabalhos de Terraplenagens	140 dias
4	**Aprovação EIA**	**278 dias**
5	Desenvolvimento EIA	218 dias
6	Aprovação CCDR-N	60 dias
7	**Fase de Concurso**	**81 dias**
8	Prazo para apresentação de propostas	21 dias
9	Análise das propostas	10 dias
10	Relatório Preliminar - audiência prévia	5 dias
11	Relatório Final - Compromisso/ Adjudicação / ..	15 dias
12	Visto do Tribunal de Contas	30 dias
13	**Fase de Empreitada**	**510 dias**
14	**Fase 1 - Terraplenagens**	**180 dias**
15	**Trabalhos Preparatórios**	**40 dias**
16	Montagem de Estaleiro	5 dias
17	Desmatação, abate e desenraizamento d...	15 dias
18	Decapagem da linha vegetal (faixa de 25m)	20 dias
19	**Movimentos de Terra**	**140 dias**
20	Escavação e aterro em linha	120 dias
21	Regularização de taludes	20 dias
22	**Fase 2 - Infraestruturas e Pavimentos**	**330 dias**
23	**Trabalhos Preparatórios**	**5 dias**
24	Montagem de Estaleiro e Implementação ..	5 dias
25	**Infraestruturas**	**120 dias**
26	Execução da rede de drenagem de água...	100 dias
27	Execução da rede de drenagem de água...	90 dias
28	Execução da rede de abastecimento de á...	90 dias
29	Execução da rede de telecomunicações - ...	90 dias
30	Execução da rede de distribuição elétrica...	90 dias
31	Execução da rede de distribuição de Gás ...	90 dias
32	**Pavimentos, Sinalização e Segurança**	**205 dias**
33	Execução do leito do pavimento	50 dias
34	Execução de passeios e baías de estacio...	120 dias
35	Execução do pavimento betuminoso	15 dias
36	Execução da Sinalização Vertical e Horizo...	10 dias
37	Tratamento Paisagistico	10 dias
38	**Fase de Exploração**	**560 dias**
39	Movimento Terras	180 dias
40	Construção de Edificios	500 dias
